




SALERNO POMPE IMPOL S.P.A.


ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL  
DEL DPR N. 14 DEL 29 MARZO 2004



IMPIANTO ACUSTICO  
DELLA RETE DI  
SOCIETA' AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.

CRONOPROGRAMMA

10/01/2018

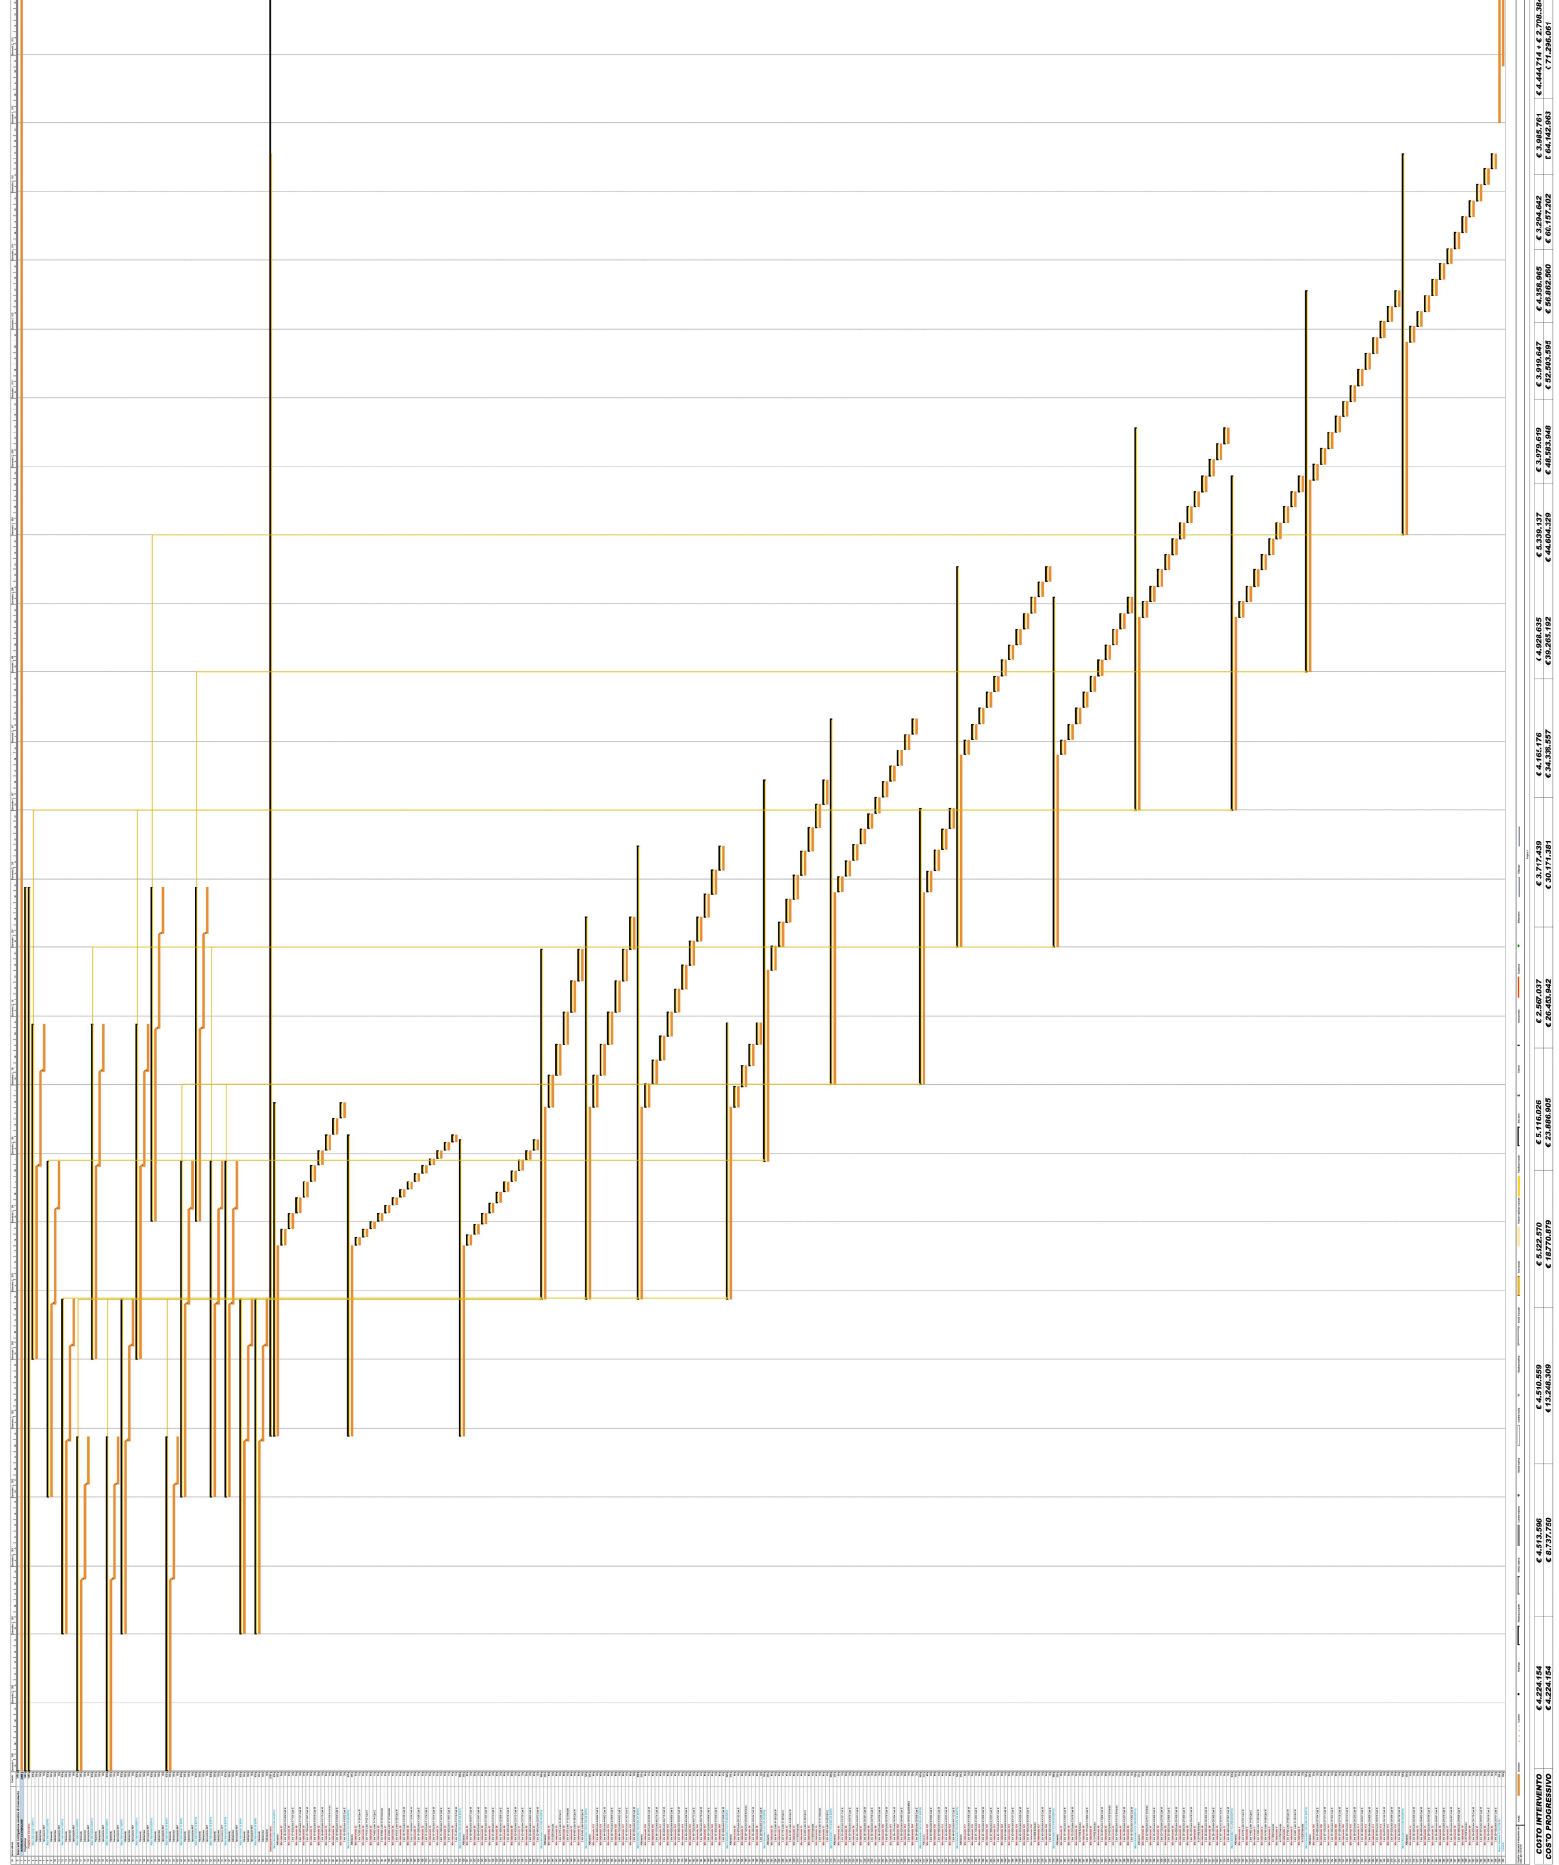

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INIZIO	FINE	COSTO INIZIALE	COSTO FINALE
PROGETTAZIONE	01/01/2018	31/12/2018	€ 4.424.154	€ 4.424.154
LAVORI DI REALIZZAZIONE	01/01/2019	31/12/2020	€ 4.424.154	€ 4.424.154
MANTENIMENTO	01/01/2021	31/12/2021	€ 4.424.154	€ 4.424.154
CANTIERI	01/01/2018	31/12/2021	€ 4.424.154	€ 4.424.154
TOTALE			€ 17.770.979	€ 17.770.979
			€ 5.522.570	€ 5.522.570
			€ 18.293.509	€ 18.293.509
			€ 2.267.037	€ 2.267.037
			€ 20.560.542	€ 20.560.542
			€ 3.171.439	€ 3.171.439
			€ 30.711.391	€ 30.711.391
			€ 34.336.957	€ 34.336.957
			€ 4.161.179	€ 4.161.179
			€ 39.265.192	€ 39.265.192
			€ 4.026.635	€ 4.026.635
			€ 44.604.239	€ 44.604.239
			€ 5.539.137	€ 5.539.137
			€ 50.143.376	€ 50.143.376
			€ 4.379.619	€ 4.379.619
			€ 54.522.995	€ 54.522.995
			€ 4.136.042	€ 4.136.042
			€ 58.659.037	€ 58.659.037
			€ 3.254.642	€ 3.254.642
			€ 61.913.679	€ 61.913.679
			€ 3.016.047	€ 3.016.047
			€ 64.929.726	€ 64.929.726
			€ 4.444.714	€ 4.444.714
			€ 69.374.440	€ 69.374.440
			€ 3.085.761	€ 3.085.761
			€ 72.460.201	€ 72.460.201
			€ 1.84.542.983	€ 1.84.542.983
			€ 3.254.642	€ 3.254.642
			€ 75.715.843	€ 75.715.843
