



POA FSC 2014-2020
Indicazioni operative per il corretto inserimento dei dati nel Sistema
Informativo «KRONOS» del Piano Operativo Ambiente

Indice dei contenuti

Obiettivi	3
Definizioni: Fasi del Progetto	4
Scadenze per l'aggiornamento dei dati di monitoraggio	5
Sezioni del SI oggetto di aggiornamento da parte del Beneficiario	6
1. Anagrafica	7
2. Gestione finanziaria	9
3. Soggetti correlati	21
4. Procedura di aggiudicazione	30
5. Iter di Progetto	31
6. Indicatori	36
Altre sezioni: Trasferimenti	39
Documenti di supporto e Manuali	40



Obiettivi

La presente guida fornisce ai **Beneficiari del PO Ambiente FSC 2014-2020** le istruzioni necessarie per il **corretto inserimento dei dati nel SI Kronos in fase di monitoraggio**, attraverso:

1. Indicazioni delle principali definizioni relative a fasi e stato di attuazione del Progetto



2. Indicazioni delle scadenze previste per l'aggiornamento di monitoraggio bimestrale



3. Illustrazione delle sezioni da aggiornare e delle corrette modalità di aggiornamento



Definizioni: Fasi del Progetto

Il SI Kronos è atto a monitorare l'intero ciclo di vita del Progetto nel corso della **fase di attuazione** dello stesso



Il Beneficiario, a partire dalla fase di attuazione, ha l'obbligo di aggiornare bimestralmente i dati nel SI, nonché di completare la rilevazione finale in fase di conclusione del Progetto

Scadenze per l'aggiornamento dei dati di monitoraggio

L'aggiornamento dei dati avviene con **cadenza bimestrale**, per permettere la trasmissione al Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio (SNM) attraverso la validazione in BDU MEF-IGRUE


Scadenze bimestrali	Aggiornamento Kronos (*)	Validazione BDU (**)
I bimestre	10 Marzo	23 Marzo
II bimestre	10 Maggio	23 Maggio
III bimestre	10 Luglio	23 Luglio
IV bimestre	10 Settembre	23 Settembre
V bimestre	10 Novembre	23 Novembre
VI bimestre e chiusura annualità di riferimento	10 Gennaio	23 gennaio

Fonti: Linee Guida del Beneficiario pag. 43

* Salvo diverse indicazioni del RSP

** Da Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 dal MEF-IGRUE

Sezioni del SI oggetto di aggiornamento da parte del Beneficiario

 **MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

POA - Piano Operativo Ambiente

Progetti


Visualizza Progetto

ANAGRAFICA | **GESTIONE FINANZIARIA** | **SOGGETTI CORRELATI** | **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE** | **ITER DI PROGETTO** | **INDICATORI** | TRASFERIMENTI



1 Sezione Anagrafica

Sezione compilata dal RSP in fase di inizializzazione. Non è oggetto di aggiornamenti di monitoraggio, ad eccezione della Localizzazione Geografica, a cura del Beneficiario

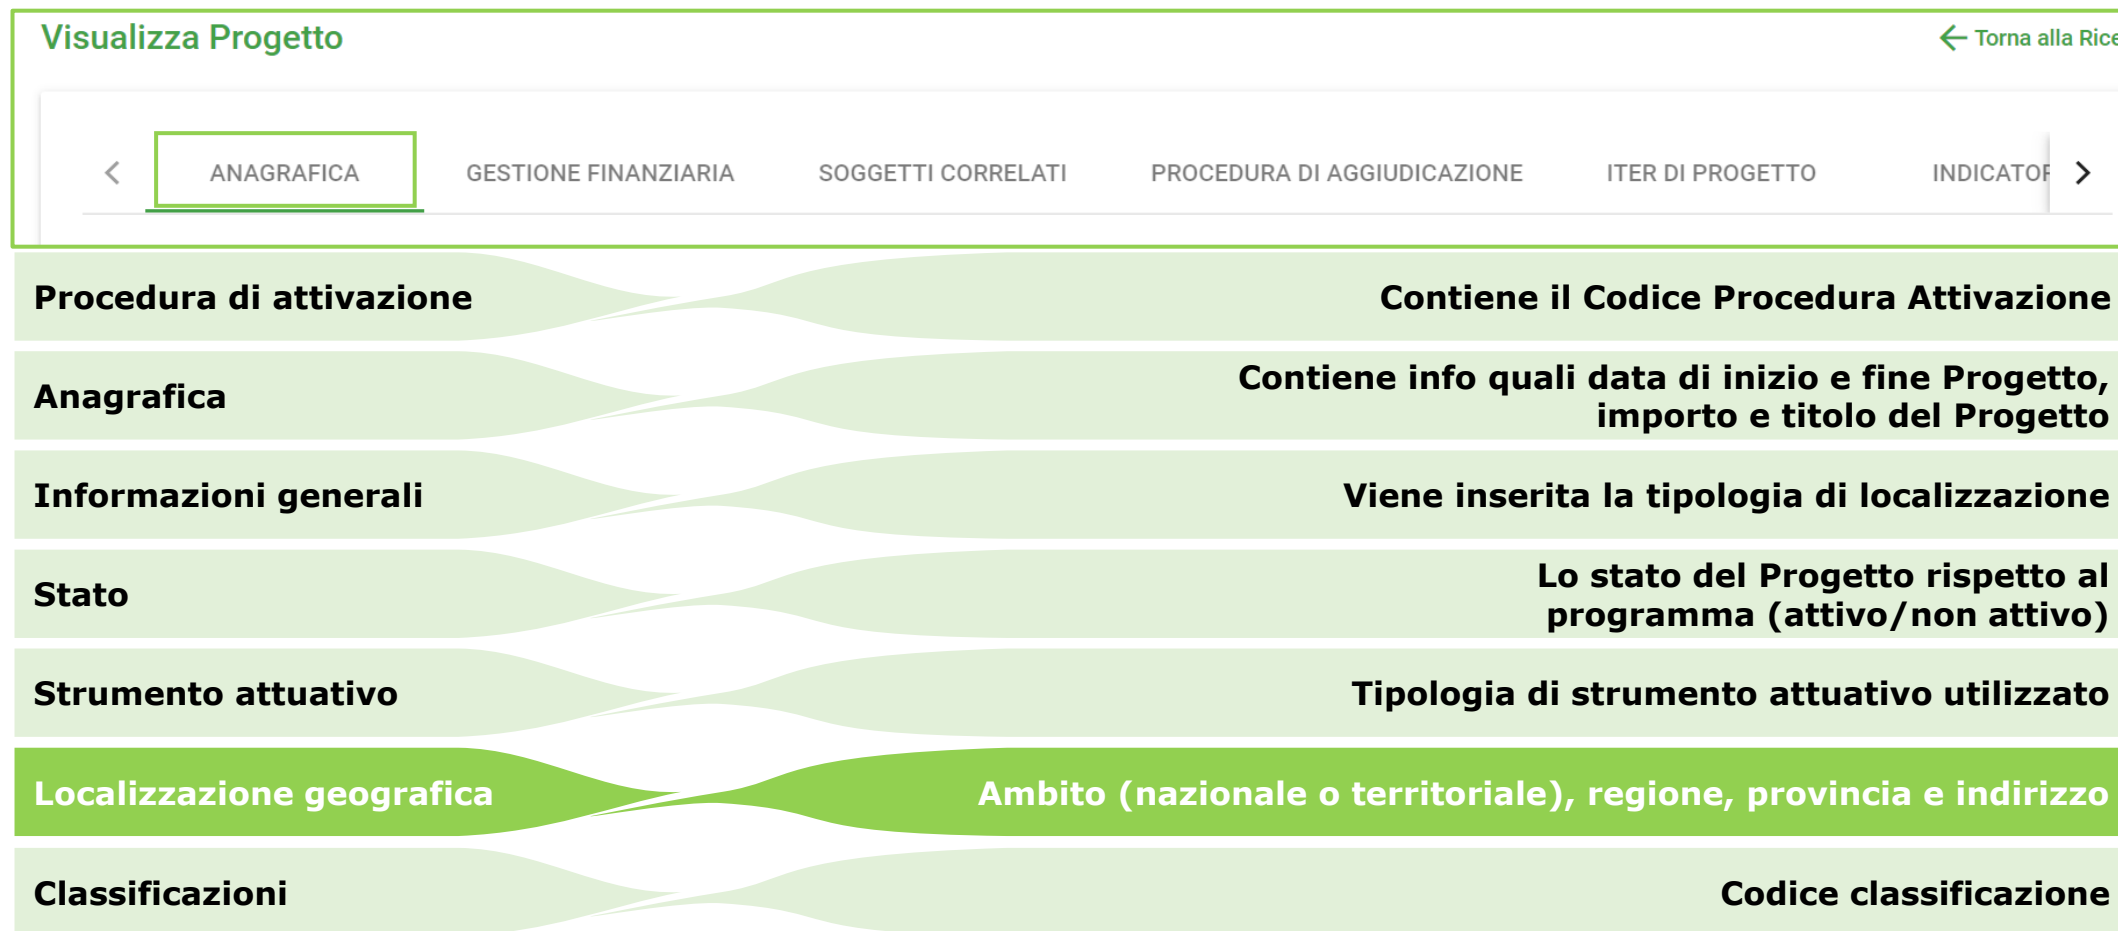

1 Sezione Anagrafica

AP06 Localizzazione geografica

Il RSP provvede a censire il dato in fase di inizializzazione del Progetto, mentre il Beneficiario provvede ad aggiornare, se necessario, unicamente il campo **Localizzazione Geografica AP06, in fase di conclusione del Progetto**

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA - AP06

Ambito* Nazionale Territoriale

Ambito	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Cap
Territoriale	CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA		

2 Sezione Gestione finanziaria

Nelle sezioni dedicate alla Gestione Finanziaria sono riportati i dati relativi al Finanziamento del Progetto (a valere sul POA ed altre fonti), alle previsioni di spesa, nonché impegni, pagamenti e dati sui percettori



01 - Finanziamento

Informazioni relative alla copertura finanziaria complessiva del Progetto

02 - Pianificazione ed Avanzamento

Previsioni e avanzamento effettivo del Progetto per annualità

03 - Impegni

Informazioni inerenti gli Impegni Giuridicamente Vincolanti

04 - Pagamenti

Informazioni inerenti i pagamenti effettuati

05 - Percettori

Informazioni sui soggetti che, nell'ambito del Progetto, hanno effettivamente percepito dei pagamenti

2 Sezione Gestione finanziaria - 01 Finanziamento

Fonti di finanziamento FN00 e Costi ammessi FN01

Queste sezioni vengono compilate dal RSP in fase di inizializzazione.

Il Beneficiario provvede ad aggiornare il campo **Fonti di finanziamento FN00** solo in caso di inserimento o modifiche alle altre fonti di finanziamento (non POA – FSC) e comunque già presenti sul data-base del SI. Il campo **Costi ammessi FN01** non è elemento di censimento del Beneficiario

ANAGRAFICA
GESTIONE FINANZIARIA
SOGGETTI CORRELATI
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
ITER DI PROGETTO
INDICATORI
TRASFERIMENTI

PROGETTO XXX_01_01

1 FINANZIAMENTO
2 PIANIFICAZIONE ED AVANZAMENTO
3 IMPEGNI
4 PAGAMENTI
5 PERCETTORI

FONTI DI FINANZIAMENTO - FN00

Fondo*	Norma*	Delibera CIPE*	Localizzazione*	Codice Fiscale Finanziatore Privato*	Importo (€)*	
FSC	Attivazione dell...	Piano operativo	NAZIONALE		1.500.000,00 €	👁
Totale Fonti Finanziamento					1.500.000,00 €	

COSTO AMMESSO - FN01

Livello Gerarchico*	Importo Ammesso (€)*
PO AMBIENTE FSC 2014-2020\FSC\Ambiente\Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi ambientali	1.500.000,00 €

2 Sezione Gestione finanziaria - 01 Finanziamento

Quadro Economico FN02

L'importo da indicare per singola voce di spesa deve essere quello (previsto o effettivo, a seconda che la relativa spesa sia stata o meno eseguita) riferito al momento della trasmissione del dato.

In fase di inizializzazione, il totale delle voci di spesa coinciderà con il costo complessivo dell'intervento, mentre in fase di attuazione il Beneficiario provvede ad aggiornare i campi del **Quadro Economico FN02**, coerentemente con le modifiche eventualmente intervenute.

A chiusura dell'intervento, i succitati campi dovranno riportare il quadro economico finale dell'intervento

1 FINANZIAMENTO		2 PIANIFICAZIONE ED AVANZAMENTO		3 IMPEGNI		4 PAGAMENTI	
QUADRO ECONOMICO - FN02							
Voce di Spesa						Importo (€)	
Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Altro (03.00)						55.760,00 €	
Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Oneri di sicurezza (03.04)						7.957,22 €	
Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Acquisizione aree o immobili (03.02)						10.000,00 €	
Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Progettazione e studi (03.01)						20.000,00 €	
Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Lavori (03.03)						547.625,43 €	
Totale Voci Spesa						641.342,65 €	

2 Sezione Gestione finanziaria - 01 Finanziamento

Quadro Economico FN02

Il Beneficiario deve inserire/aggiornare sia l'importo previsto delle spese che ancora non sono state eseguite, sia l'importo effettivo di quelle che sono state sostenute, al momento della trasmissione del dato

Esempio di corretto inserimento



1 FINANZIAMENTO	2 PIANIFICAZIONE ED AVANZAMENTO	3 IMPEGNI	4 PAGAMENTI
QUADRO ECONOMICO - FN02			
Voce di Spesa		Importo (€)	
Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Altro (03.00)		55.760,00 €	
Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Oneri di sicurezza (03.04)		7.957,22 €	
Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Acquisizione aree o immobili (03.02)		10.000,00 €	
Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Progettazione e studi (03.01)		20.000,00 €	
Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Lavori (03.03)		547.625,43 €	
Totale Voci Spesa			
641.342,65 €			

I dati in questo esempio sono stati aggiornati correttamente: sono state elencate tutte voci di spesa che concorrono a formare il Costo del Progetto

2 Sezione Gestione finanziaria - 02 Pianificazione e avanzamento - Piano dei Costi FN03

Il Beneficiario, in fase di **inizializzazione**, provvede ad inserire i dati coerentemente con quanto programmato; in fase **attuazione**, provvede ad aggiornare il campo **Piano dei Costi FN03** ad ogni **monitoraggio**, per evidenziare il reale andamento del Progetto.

In occasione del monitoraggio del **VI bimestre** è importante **aggiornare il Totale realizzato**

Visualizza Progetto ← Torna alla Ri

ANAGRAFICA **GESTIONE FINANZIARIA** SOGGETTI CORRELATI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ITER DI PROGETTO INDICATORI TRASFERIMENTI

PROGETTO XXX_01_01

1 FINANZIAMENTO —
 2 PIANIFICAZIONE ED AVANZAMENTO —
 3 IMPEGNI —
 4 PAGAMENTI —
 5 PERCETTORI

PIANO DEI COSTI - FN03

Anno	Importo Realizzato (€)	Valore da realizzare – Importo complessivo (€)	Totale per annualità (€)
2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	0,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
2021	0,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
Totale Importo Realizzato(€)		Totale Valore da realizzare(€)	Totale complessivo(€)
0,00 €		1.500.000,00 €	1.500.000,00 €

2 Sezione Gestione finanziaria - 02 Pianificazione e avanzamento - Piano dei Costi FN03

Il Beneficiario deve indicare/aggiornare sia l'importo realizzato rispetto alle annualità concluse, sia l'importo da realizzare per le annualità a venire

Esempio di corretto inserimento



PIANO DEI COSTI - FN03			
Anno	Importo Realizzato (€)	Valore da realizzare - Importo complessivo (€)	Totale per annualità (€)
2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	0,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
2021	0,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
Totale Importo Realizzato(€)	0,00 €	Totale Valore da realizzare(€)	1.500.000,00 €
		Totale complessivo(€)	1.500.000,00 €

Nell'anno 2020 erano previsti dei costi che non sono stati sostenuti. Pertanto è stato necessario rimodulare il costo complessivo, distribuendo l'importo nei campi «valore da realizzare» negli anni successivi. L'anno 2020 è concluso, il totale per annualità è stato aggiornato all'importo effettivamente realizzato, in questo caso pari a zero.


2 Sezione Gestione finanziaria - 02 Pianificazione e avanzamento - Piano dei Costi FN03

Esempio di errato inserimento



FINANZIAMENTO			
2 PIANIFICAZIONE ED AVANZAMENTO			
3 IMPEGNI			
4 PAGAMENTI			
PIANO DEI COSTI - FN03			
Anno	Importo Realizzato (€)	Valore da realizzare - Importo complessivo (€)	Totale per annualità (€)
2019	0,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
2022	0,00 €	2.645.244,00 €	2.645.244,00 €
2021	0,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
2020	0,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
2018	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Totale Importo Realizzato(€)		Totale Valore da realizzare(€)	Totale complessivo(€)
0,00 €		9.645.244,00 €	9.645.244,00 €

I dati relativi al piano dei costi indicati nel Progetto non sono stati aggiornati correttamente per le annualità terminate. L'importo da realizzare non è stato riproporzionato nelle annualità successive. Al termine di ciascuna annualità occorre azzerare l'importo da realizzare. L'importo complessivo deve essere suddiviso nelle annualità successive.



2 Sezione Gestione finanziaria – 03 Impegni FN04

Questa sezione viene compilata dal Beneficiario **in fase di attuazione**, aggiornando **con l'importo degli impegni a valere sulle Fonti di Finanziamento Pubbliche**, il campo **Impegni FN04**, indicando in caso di disimpegno anche la relativa causale

FINANZIAMENTO — PIANIFICAZIONE ED AVANZAMENTO — **3 IMPEGNI** — PAGAMENTI — PERCETTORI

DATI IMPEGNO - FN04

Codice Impegno - Estremi dell'Atto Amministrativo di Impegno Determina n.157	Tipologia Impegno Impegno
Importo totale impegno (escluso finanziamento privato) € 6.356,83	Causale Disimpegno
Data Impegno 30/05/2019	




2 Sezione Gestione finanziaria – 03 Impegni FN05

Questa sezione viene compilata dal Beneficiario **in fase di attuazione**, aggiornando **con l'importo dei soli impegni a valere sul POA FSC**, il campo **Impegni Ammessi FN05**

IMPEGNO AMMESSO - FN05

Livello Gerarchico	Importo Impegno Ammesso (€)	Data Impegno Ammesso
PO AMBIENTE FSC 2014-2020\FSC\Ambiente\Servizio idrico integrato	194.000,00 €	30/11/2015
Totale Impegni Ammessi		
194.000,00 €		



2 Sezione Gestione finanziaria – 04 Pagamenti FN06

Questa sezione viene compilata dal Beneficiario **in fase di attuazione**, aggiornando il **campo Pagamenti FN06**, relativamente ai pagamenti effettuati con riferimento agli impegni a valere sulle Fonti di Finanziamento Pubbliche, gli estremi di pagamento, la causale di pagamento (anticipo, pagamento intermedio, saldo o altro), l'importo e la data di pagamento

FINANZIAMENTO	PIANIFICAZIONE ED AVANZAMENTO	IMPEGNI	4 PAGAMENTI	PERCETTIVE
---------------	-------------------------------	---------	--------------------	------------

PAGAMENTI - FN06					
Codice Pagamento - Estremi Mandato di Pagamento	Causale Pagamenti	Tipologia Pagamenti	Data Pagamenti	Importo Pagamenti (€)	
452	Saldo	Pagamento	05/06/2019	6.356,83 €	✓
830	Saldo	Pagamento	15/10/2020	3.123,12 €	✓
Totale Pagamenti				9.479,95 €	

2 Sezione Gestione finanziaria – 04 Pagamenti FN07

Questa sezione viene compilata dal Beneficiario **in fase di attuazione**, aggiornando il **campo Pagamenti Ammessi FN07**, relativamente ai pagamenti effettuati con riferimento agli impegni a valere sul POA FSC, gli estremi di pagamento, la causale di pagamento (anticipo, pagamento intermedio, saldo o altro), l'importo e la data

Codice Pagamento - Estremi Mandato di Pagamento	Causale Pagamenti	Tipologia Pagamenti	Data Pagamenti	Importo Pagamenti (€)		
1784	Saldo	Pagamento	10/11/2020	201,35 €	👁	▼
116	Pagamento intermedio	Pagamento	22/03/2021	140.544,23 €	👁	▼
1864/1	Saldo	Pagamento	14/12/2020	832,41 €	👁	▼
1864/2	Saldo	Pagamento	14/12/2020	297,29 €	👁	▼
1865	Pagamento intermedio	Pagamento	23/11/2020	3.497,51 €	👁	▲
Livello Gerarchico				Importo Pagamento Ammesso	Data Pagamento Ammesso	
PO AMBIENTE FSC 2014-2020\FSC\Ambiente\Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese				3.497,51 €	23/11/2020	
				Totale Pagamenti		
				145.372,79 €		

2 Sezione Gestione finanziaria – 05 Percettori FN08

Questa sezione viene compilata dal Beneficiario **in fase di attuazione**, aggiornando il campo **Percettori FN08**, indicando il codice di pagamento, il CF del percettore, se si tratta o meno di soggetto pubblico, il tipo di percettore, cioè il soggetto destinatario del finanziamento pubblico (es. impresa, professionista, ecc.) e l'importo

FINANZIAMENTO — PIANIFICAZIONE ED AVANZAMENTO — IMPEGNI — PAGAMENTI — **5 PERCETTORI**

PERCETTORI - FN08				
Codice Pagamento	Codice Fiscale Percettore	Soggetto Pubblico	Tipo Percettore	Importo (€)
452	02073510907	N	Imprese	6.356,83 €
830	02779800909	N	Professionista	3.123,12 €

FINANZIAMENTO — PIANIFICAZIONE ED AVANZAMENTO — IMPEGNI — PAGAMENTI — **5 PERCETTORI**

DATI PERCETTORE - FN08

Codice Pagamento - Estremi Mandato di Pagamento 452	Codice Fiscale Percettore 02073510907
Soggetto Pubblico* <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Tipo Percettore Imprese
Importo € 6.356,83	

3 Soggetti correlati

Sono i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito PO Ambiente FSC 2014-2020

Visualizza Progetto

ANAGRAFICA GESTIONE FINANZIARIA **SOGGETTI CORRELATI** PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ITER DI PROGETTO INDICATORI TRASFERIMENTI

01 - Programmatore del Progetto

Soggetto a cui fa capo la decisione di attuare il Progetto; è identificato con la DG, responsabile dell'attuazione del singolo Sotto-Piano; i Soggetti coinvolti sono: RSP, RLA e, se previsto, RA

02 - Beneficiario del Progetto

Organismo pubblico responsabile dell'avvio e dell'attuazione degli interventi, a cui il MiTE trasferisce le risorse finanziarie

03 - Attuatore del Progetto

Soggetto responsabile dell'attuazione del Progetto; Attuatore e Beneficiario possono coincidere nello stesso soggetto oppure essere soggetti distinti

04 - Realizzatore del Progetto

Soggetto che realizza effettivamente il Progetto. Società titolari di contratti di appalto che forniscono servizi/ eseguono i lavori



3 Soggetti correlati

Questa sezione viene compilata dal RSP in fase di inizializzazione con i dati del Programmatore e del Beneficiario.

Il Soggetto Attuatore e il Soggetto Realizzatore sono facoltativi e vengono immessi dal Beneficiario in fase di attuazione

PROGETTO XXX_01_01						
SOGGETTI CORRELATI - SC00						
Id Soggetto	Ruolo Soggetto	CF Soggetto	Soggetto Pubblico	Codice dell'unità organizzativa di riferimento	Soggetto	Forma Giuridica
35	Beneficiario del progetto	93021010140	SI	udaps	Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio	Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000
126	Programmatore del progetto	97222270585	SI	8HCH2C	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque	Ministero
250	Attuatore del progetto	80003550144	NO		S.Ec.Am. S.p.A	Società per azioni
250	Realizzatore del progetto	80003550144	NO		S.Ec.Am. S.p.A	Società per azioni



3 Soggetti correlati

Qualora il **Soggetto Attuatore** e il **Beneficiario** siano soggetti distinti, il Beneficiario deve indicare il Soggetto Attuatore. Il Beneficiario inserisce il ruolo del soggetto, il CF, il codice dell'unità organizzativa di riferimento (solo se soggetto pubblico), la classificazione ATECO (per i soli soggetti che svolgono attività economica) e la forma giuridica

Esempio in cui Soggetto Attuatore e Beneficiario non coincidono

PROGETTO XXX_01_01							
SOGGETTI CORRELATI - SC00							
Id Soggetto	Ruolo Soggetto	CF Soggetto	Soggetto Pubblico	Codice dell'unità organizzativa di riferimento	Soggetto	Forma Giuridica	
126	Programmatore del progetto	97222270585	SI	BHCH2C	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque	Ministero	👁
970	Attuatore del progetto	00433220027	SI	UFFI3K	Comune di Mollia	Comune	👁
946	Beneficiario del progetto	97834740017	SI	UFMDLO	Commissario di Governo contro il Dissesto idrogeologico Piemonte	Regione	👁



3 Soggetti correlati

Il **Soggetto Attuatore**, in quanto responsabile per le attività del Progetto, avrà un profilo utente Kronos con funzioni identiche a quelle del Beneficiario, esclusa la funzione di trasmissione; i progetti che può visualizzare e aggiornare sono quelli con stato 'in carico al beneficiario' di cui è Attuatore

Esempio in cui Soggetto Attuatore e Beneficiario non coincidono

PROGETTO XXX_01_01							
SOGGETTI CORRELATI - SC00							
Id Soggetto	Ruolo Soggetto	CF Soggetto	Soggetto Pubblico	Codice dell'unità organizzativa di riferimento	Soggetto	Forma Giuridica	
126	Programmatore del progetto	97222270585	SI	BHCH2C	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque	Ministero	👁
970	Attuatore del progetto	00433220027	SI	UFFI3K	Comune di Mollia	Comune	👁
946	Beneficiario del progetto	97834740017	SI	UFMDLO	Commissario di Governo contro il Dissesto idrogeologico Piemonte	Regione	👁



3 Soggetti correlati

Il **Soggetto Attuatore** può essere sia un Soggetto Pubblico che un Soggetto Privato.

Il Beneficiario, nell'aggiornamento dei dati, deve anche indicare la tipologia del Soggetto (Pubblico o Privato)

Esempio in cui il Soggetto Attuatore è un Soggetto Pubblico

PROGETTO XXX_01_01						
SOGGETTI CORRELATI - SC00						
Id Soggetto	Ruolo Soggetto	CF Soggetto	Soggetto Pubblico	Codice dell'unità organizzativa di riferimento	Soggetto	Forma Giuridica
126	Programmatore del progetto	97222270585	SI	8HCH2C	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque	Ministero
822	Beneficiario del progetto	94200620485	SI	1E9CWJ	Ufficio del Commissario Straordinario Delegato TOSCANA	Regione
1418	Realizzatore del progetto	00610340457	NO		TECNOPALI APUANA SRL	Società a responsabilità limitata
218	Attuatore del progetto	01421240480	SI	UF38AK	Comune di Reggello	Comune

3 Soggetti correlati

Esempio in cui il Soggetto Attuatore è un Soggetto Privato



PROGETTO XXX_01_01						
SOGGETTI CORRELATI - SC00						
Id Soggetto	Ruolo Soggetto	CF Soggetto	Soggetto Pubblico	Codice dell'unità organizzativa di riferimento	Soggetto	Forma Giuridica
35	Beneficiario del progetto	93021010140	SI	udaps	Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio	Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000
126	Programmatore del progetto	97222270585	SI	8HCH2C	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque	Ministero
250	Attuatore del progetto	80003550144	NO		S.Ec.Am. S.p.A	Società per azioni
250	Realizzatore del progetto	80003550144	NO		S.Ec.Am. S.p.A	Società per azioni



3 Soggetti correlati

Il **Soggetto Attuatore** ed il **Soggetto Realizzatore** possono essere soggetti distinti o coincidenti. **Il Soggetto Realizzatore deve essere indicato anche quando coincide con il Soggetto Attuatore.** In particolare, il Beneficiario (o l'Attuatore se ne sta facendo le veci) deve inserire il ruolo del soggetto, il CF, il codice dell'unità organizzativa di riferimento, la classificazione ATECO e la forma giuridica

Esempio in cui il Soggetto Attuatore e il Soggetto Realizzatore coincidono

PROGETTO XXX_01_01						
SOGGETTI CORRELATI - SC00						
Id Soggetto	Ruolo Soggetto	CF Soggetto	Soggetto Pubblico	Codice dell'unità organizzativa di riferimento	Soggetto	Forma Giuridica
35	Beneficiario del progetto	93021010140	SI	udaps	Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio	Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000
126	Programmatore del progetto	97222270585	SI	8HCH2C	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque	Ministero
250	Attuatore del progetto	80003550144	NO		S.Ec.Am. S.p.A	Società per azioni
250	Realizzatore del progetto	80003550144	NO		S.Ec.Am. S.p.A	Società per azioni

3 Soggetti correlati



Esempio e visualizzazione in dettaglio dei dati di un soggetto correlato, con la definizione della tipologia di soggetto (pubblico o altro), la forma giuridica, la denominazione del soggetto e la classificazione ATECO. Laddove previsto, è possibile l’inserimento anche di un contatto e-mail del soggetto in questione. Nella schermata di esempio in basso, i dati riportati sono relativi ad un Soggetto Realizzatore

ANAGRAFICA GESTIONE FINANZIARIA **SOGGETTI CORRELATI** PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ITER DI PROGETTO INDICATORI TRASFERIMENTI

PROGETTO XXX_01_01

DATI GENERALI - SC00

Soggetto Pubblico* Sì No

Codice dell'unità organizzativa di riferimento

Forma Giuridica
1.3.20 - Società a responsabilità limitata

Soggetto
SIMEDIL S.R.L.

Classificazione ATECO
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Email

.it

3 Soggetti correlati

Esempio in cui il Soggetto Attuatore e il Soggetto Realizzatore non coincidono



PROGETTO XXX_01_01						
SOGGETTI CORRELATI - SC00						
Id Soggetto	Ruolo Soggetto	CF Soggetto	Soggetto Pubblico	Codice dell'unità organizzativa di riferimento	Soggetto	Forma Giuridica
126	Programmatore del progetto	97222270585	SI	8HCH2C	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque	Ministero
128	Beneficiario del progetto	96065970186	SI	asuap	Ufficio d' Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia	Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000
186	Attuatore del progetto	02234900187	NO		Pavia Acque s.c.a r.l.	Società consortile
1632	Realizzatore del progetto	02307880183	NO		LC GENERAL SCAVI S.R.L.	Società a responsabilità limitata

4 Sezione Procedura di Aggiudicazione

Questa sezione viene compilata dal Beneficiario **in fase di attuazione**, aggiornando il campo **Procedura di Aggiudicazione PG00**, che contiene il codice di procedura, il CIG, la descrizione della procedura, il tipo di procedura di aggiudicazione, la data di pubblicazione e di aggiudicazione, la base d'asta e l'importo aggiudicato

Visualizza Progetto ← Torna alla Ricerca

ANAGRAFICA GESTIONE FINANZIARIA SOGGETTI CORRELATI **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE** ITER DI PROGETTO INDICATORI TRASFERIMENTI

PROGETTO XXX_01_01

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - PG00 ^

Codice Procedura di Aggiudicazione	Codice Identificativo di Gara (CIG)	Motivo Assenza CIG	Descrizione Procedura Aggiudicazione	Tipo Procedura Aggiudicazione	Data Pubblicazione	Importo Procedura Aggiudicazione (€)	Data Aggiudicazione	Importo Aggiudicato (€)
PNM_25_05_PG03	Z412CF682E		SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART.26 DEL D.LGS.50/2016. AFFIDAMENTO OPERATORE ECONOMICO BTP ITALIA S.R.L.	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 comma 2 lett a) D.LGS. 50/2016	1/5/2020	11.738,05 €	25/5/2020	5.522,67 €
PNM_25_05_PG04	ZCE2530448		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA DOMUS S.R.L. C.F./PIVA 02073510907 PER ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE AI FINI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 comma 2 lett a) D.LGS. 50/2016	27/9/2018	6.579,32 €	10/10/2018	6.356,83 €

5 Sezione Iter di Progetto

Il Beneficiario deve indicare/aggiornare ciascuna fase dell'iter procedurale se effettivamente avviata/completata oppure ancora da avviare

Visualizza Progetto ← Torna alla Ricerca

<
ANAGRAFICA
GESTIONE FINANZIARIA
SOGGETTI CORRELATI
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
ITER DI PROGETTO
INDICATORI
>

PROGETTO XXX_01_01

Iter

Informazioni sulla fase procedurale e le date di avvio e di fine previste ed effettive delle attività

Stato di attuazione del Progetto

Informazioni sullo stato del Progetto (es. in corso) e la data dell'ultimo aggiornamento



5 Sezione Iter di Progetto - Iter

Il Beneficiario provvede, in fase di inizializzazione, ad inserire i dati nel rispetto di quanto programmato; in corso di attuazione, provvede ad aggiornare il **campo Iter PR00**.

Per ciascuna fase procedurale deve aggiornare **sia le date previste che quelle effettive, di avvio e di fine**

Visualizza Progetto ← Torna alla Ricerca

< ANAGRAFICA GESTIONE FINANZIARIA SOGGETTI CORRELATI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE **ITER DI PROGETTO** INDICATORI >

PROGETTO XXX_01_01

ITER - PR00 ▼

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO - PR01 ▼



5 Sezione Iter di Progetto - Iter

Questa sezione viene valorizzata dal RSP in fase di inizializzazione con «Esecuzione non avviata».

Il Beneficiario provvede ad aggiornare il **campo Stato di attuazione del progetto PR01 coerentemente con le date effettive di inizio e fine attività inserite nella sezione Iter.**

Stato di attuazione	Descrizione delle attività di progetto corrispondenti
Esecuzione non avviata	<ul style="list-style-type: none"> • Intervento in fase di inizializzazione, risorse stanziati e beneficiari identificati, primo inserimento in Kronos; • Attività preliminari avviate o concluse (es. progettazione definitiva/esecutiva), esecuzione dei lavori/servizi/forniture non avviati
In corso di esecuzione	Attività di lavori/servizi/forniture avviati e in corso a seguito della stipula dei contratti
Concluso	Progetto in corso di collaudo/collaudato/impianto in esercizio
In esercizio	
Sospeso per altri motivi	Progetti sospeso per: <ul style="list-style-type: none"> • Procedimento Giudiziario (Reg. 1303/2013 art. 87, co 1 lett. a) • Ricorso Amministrativo (Reg. 1303/2013 art. 87, co 1 lett. a) • Cause di Forza Maggiore (Reg. 1303/2013 art. 87, co 1 lett. b) • Altro



5 Sezione Iter di Progetto

Esempio di errato inserimento 1



ITER - PR00				
Fase Procedurale	Data Avvio Prevista	Data Fine Prevista	Data Avvio Effettiva	Data Fine Effettiva
0303-Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Progettazione Definitiva	1/6/2018	15/4/2019	1/6/2018	1/6/2019
0304-Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Progettazione Esecutiva	1/5/2019	1/10/2019	5/8/2019	10/5/2021
0305-Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Stipula Contratto	11/12/2019	12/11/2020	11/12/2019	12/11/2020
0306-Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Esecuzione Lavori	1/11/2021	6/6/2023	1/11/2021	
0307-Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Collaudo	1/1/2021	1/9/2021		

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO - PR01	
Stato Progetto In Corso di esecuzione	Data 23/03/2021

I dati indicati nel Progetto indicano **date effettive non coerenti**. Nella fase di progettazione si indica come data effettiva di fine lavori del 10/05/2021, successiva alla data di aggiornamento del SI



5 Sezione Iter di Progetto

Esempio di errato inserimento 2



ITER - PR00				
Fase Procedurale	Data Avvio Prevista	Data Fine Prevista	Data Avvio Effettiva	Data Fine Effettiva
0301-Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Studio di fattibilità	2/11/2018	2/12/2018		
0302-Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Progettazione Preliminare	2/11/2018	2/12/2018		
0303-Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Progettazione Definitiva	2/12/2018	15/2/2019		
0304-Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Progettazione Esecutiva	15/2/2019	2/5/2019		
0305-Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Stipula Contratto	2/5/2019	31/5/2019		
0306-Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Esecuzione Lavori	18/9/2019	12/12/2020		
0307-Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) - Collaudo	12/12/2020	31/12/2020		

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO - PR01	
Stato Progetto In Corso di esecuzione	Data 23/03/2021

I dati indicati nel progetto indicano date di fine lavori previste non coerenti con la data di aggiornamento. Il progetto riporta lo stato di attuazione "in corso di esecuzione", ma le date effettive di avvio e fine non sono state indicate.

6 Sezione Indicatori

La sezione contiene due tipologie di indicatori: gli indicatori **di risultato**, inseriti dal RSP in fase di inizializzazione in base agli indicatori definitivi a livello nazionale; gli indicatori **di output**, aggiornati dal Beneficiario in fase di attuazione e di conclusione in base al valore realizzato

Visualizza Progetto ← Torna alla Ricerca

< TIONE FINANZIARIA
SOGGETTI CORRELATI
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
ITER DI PROGETTO
INDICATORI
TRASFERIMENTI >

PROGETTO XXX_01_01

INDICATORI DI RISULTATO - IN00 v

INDICATORI DI OUTPUT - IN01 v

Indicatori di risultato

Indicatore di risultato e codice indicatore

Indicatori di output

Indicatore di output, codice dell'indicatore, valore realizzato e valore programmato

6 Sezione Indicatori – Indicatori di Risultato

L'aggiornamento di questa sezione è a carico del RSP

Visualizza Progetto ← Torna alla Ricerca

ANAGRAFICA GESTIONE FINANZIARIA SOGGETTI CORRELATI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ITER DI PROGETTO **INDICATORI** TRASFERIMENTI

PROGETTO XXX_01_01

INDICATORI DI RISULTATO - IN00 ^

Indicatore di Risultato	Codice Indicatore
COM	Popolazione esposta a rischio alluvione
COM	Popolazione esposta a rischio frane



6 Sezione Indicatori – Indicatori di output

Questa sezione viene compilata dal RSP in fase di inizializzazione, indicando il valore programmato, in coerenza con quanto condiviso con il Beneficiario.

Il valore realizzato deve essere aggiornato dal Beneficiario **a conclusione della fase di esecuzione nell'iter di Progetto.**

Visualizza Progetto ← Torna all

ANAGRAFICA GESTIONE FINANZIARIA SOGGETTI CORRELATI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ITER DI PROGETTO **INDICATORI** TRASFERIMENTI

PROGETTO XXX_01_01

INDICATORI DI RISULTATO - IN00 ▼

INDICATORI DI OUTPUT - IN01 ▲

Indicatore di Output*	Codice Indicatore*	Valore Programmato*	Valore Realizzato
COM	Superficie degli...	16.717	0

Altre sezioni: Trasferimenti

L'aggiornamento di questa sezione è a carico del RSP

← TIONE FINANZIARIA SOGGETTI CORRELATI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ITER DI PROGETTO INDICATORI TRASFERIMENTI →									
PROGETTO XXX_01_01									
TRO0-TRASFERIMENTI ^									
Denominazione soggetto ricevente	Codice Trasferimento	Causale Trasferimento	Importo Trasferimento (€)	Data Trasferimento	C/C soggetto ricevente	Disposizione di pagamento	Data disposizione di pagamento	OPF	Data OPF
Trasferimenti non trovati.									

Documenti di supporto e Manuali

disponibili sul SI Kronos, cliccando sul punto interrogativo in alto a destra accanto all'icona utente.



- **Manuale Utente Kronos**
- **Vademecum Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio (SNM) 2014-2020**
- **Monitoraggio Unitario Progetti – Controlli di validazione**
- **Protocollo Unico di Colloquio BDU MEF - IGRUE**

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

POA - Piano Operativo Ambiente

Progetti Report

Ricerca Progetti

Ricerca Avanzata

Codice Progetto	Titolo	Stat	Data Fine	CF Beneficiario	Beneficiario	Codice Procedura Attivazione
<input type="text" value="Codice Progetto"/>	<input type="text" value="Titolo"/>	<input type="text" value="St"/>	<input type="text" value="Data Fine"/>	<input type="text" value="CF Beneficiari"/>	<input type="text" value="Beneficiario"/>	<input type="text" value="Codice Pr"/>
PNM_25_06	RIORGANIZZAZIONE MESSA I...	Inol	30/09/2022	92073010909	AREA MARINA ...	PRATT21756
PNM_25_05	FALESIA PUNTA GIGLIO ALGH...	Inol	30/07/2022	92073010909	AREA MARINA ...	PRATT21756

Download files

- [Manuale Utente dell'applicazione POA – FSC](#)
- [Monitoraggio Unitario Progetti – Protocollo Unico di Colloquio vers. 2.1](#)
- [Monitoraggio Unitario Progetti – Controlli di Validazione vers. 2.1](#)
- [Vademecum Monitoraggio vers. 1.0](#)

Chiudi
